

文京区立明化小学校 改築工事ステップ図

【現況】



【STEP1: 仮設校舎建設】



校庭に仮設校舎を建設する

【STEP2: 現校舎東側解体】



教室及び管理諸室の機能を仮設校舎に移し、既存校舎の一部を解体する

【STEP3: 新校舎I期建設】



【新校舎 (I期)】
体育館・プール・給食室・幼稚園等
体育館や給食室は改築工事中も使用
できるように計画する

【STEP4: 現校舎西側解体】




体育館・プール・給食室・幼稚園の機能を新校舎に移し、既存校舎を解体する

【STEP5: 新校舎II期建設】



【新校舎 (II期)】
普通教室・特別教室・管理諸室・
育成室等

【STEP6: 仮設校舎解体・校庭整備】

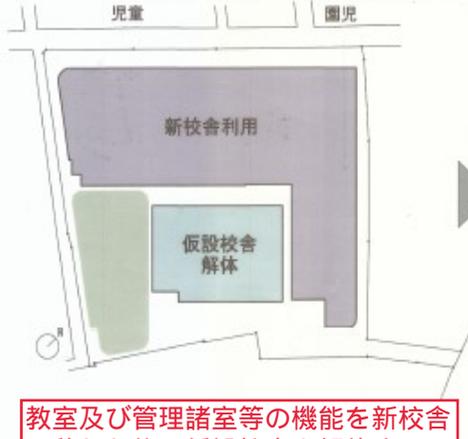

教室及び管理諸室等の機能を新校舎に移した後、仮設校舎を解体する

【完成時】



- 凡例
- 工事車両動線
 - 児童・園児動線
 - 校庭・園庭
 - 工事中建物
 - 解体建物
 - 利用建物
 - 工事エリア
