


## 主要土木工事の進捗状況について

令和3年10月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第843号) その1 大塚五丁目28～13番先	車道舗装工(排水性) 961.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(透水性) 284.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(アスコン) 197.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年12月4日 ) 令和3年11月30日  ( 80% )
2	バリアフリー整備工事 (区道第843号) その2 大塚六丁目11番～ 豊島区東池袋五丁目43番先	車道舗装工(排水性) 1,806.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(透水性) 734.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(アスコン) 369.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年7月30日 ) 令和5年1月18日  ( 5% )
3	バリアフリー整備工事 (区道第841号) 目白台一丁目9～18番先	車道舗装工(排水性) 1,255.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(透水性) 267.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工(アスコン) 52.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年5月14日 ) 令和4年2月22日  ( 65% )
4	視覚障害者誘導用施設設置工事 (区道第892号) 西片一丁目15番～ 本郷六丁目26番先	視覚障害者誘導用 シート設置工 458.0 m <sup>2</sup>	令和3年7月21日 ) 令和4年1月13日  ( 20% )
5	コミュニティ道路整備工事 (区道第869号) 向丘二丁目6番～ 千駄木一丁目12番先	車道舗装工(透水性) 1,270.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年5月14日 ) 令和3年10月7日  ( 100% )
6	電線共同溝整備工事 (区道第889号) 音羽一丁目1番～ 水道二丁目13番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年6月25日 ) 令和5年6月23日  ( 10% ) 工事一時中止
7	電線共同溝設置工事 (区道第870号) 向丘二丁目16番～ 根津一丁目27番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年10月1日 ) 令和5年12月4日  ( 5% )
8	駒塚橋補修工事 関口一丁目35番先	コンクリート補修工 1.0 式 鋼桁塗装工 1.0 式 防護柵工 1.0 式 舗装工 1.0 式 伸縮装置取替工 1.0 式 沓座モルタル補修工 1.0 式	令和3年7月30日 ) 令和4年3月14日  ( 30% )

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第946号外） 大塚三丁目18～17番先外	車道舗装工(透水性) 2,591.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年4月1日 ～ 令和3年10月19日  ( 100% )
10	道路改修工事（区道第213号） 小石川三丁目13～17番先	車道舗装工(透水性) 784.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年4月1日 ～ 令和3年8月5日  ( 100% )
11	道路改修工事（区道第37号） 音羽一丁目23番先	車道舗装工(透水性) 109.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年5月6日 ～ 令和3年9月21日  ( 100% )
12	道路改修工事（区道第156号） 小日向四丁目3番～ 小日向一丁目27番先	車道舗装工(アスコン) 1,400.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年7月21日 ～ 令和4年1月20日  ( 10% )
13	道路改修工事（区道第830号） 本郷二丁目30～35番先	車道舗装工(透水性) 1,308.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年9月28日 ～ 令和4年3月28日  ( 10% )
14	道路改修工事（特別区道第239号） 白山二丁目15～9番先	車道舗装工(アスコン) 2,290.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年10月28日 ～ 令和4年3月16日  ( 5% )
15	公共下水道枝線整備工事 （文京区弥生二丁目付近再構築その3工事） 弥生二丁目付近	管きょ工（開削） 275.8 m 管きょ工（反転・形成工法） 168.3 m 取付管及びます工 16.0 箇所 人孔設置工 9.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和3年6月8日 ～ 令和4年2月2日  ( 35% )
16	下水道施設整備工事 （文京区西片二丁目付近管渠整備工事） 西片二丁目付近	管きょ工（開削） 34.0 m 取付管及びます工 5.0 箇所 人孔設置工 2.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和3年7月21日 ～ 令和4年2月28日  ( 10% )

令和3年度 文京区道路工事等予定箇所図

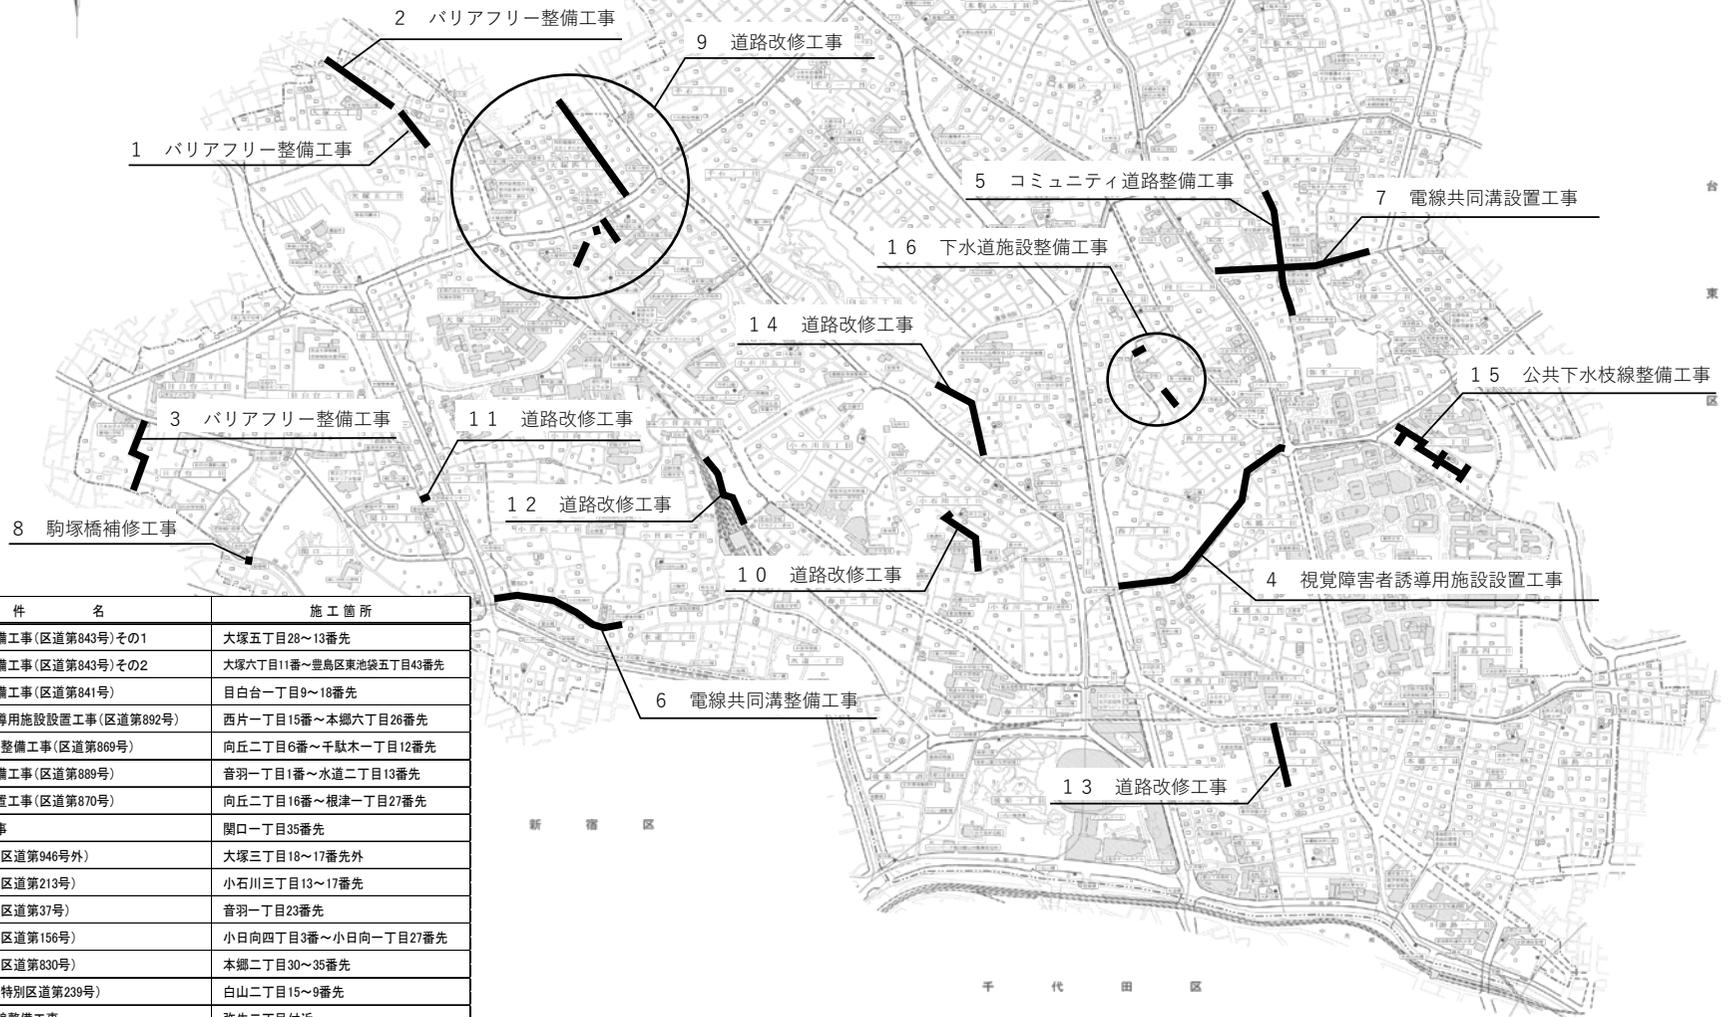

番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事(区道第843号)その1	大塚五丁目28～13番先
2	バリアフリー整備工事(区道第843号)その2	大塚六丁目11番～豊島区東池袋五丁目43番先
3	バリアフリー整備工事(区道第841号)	目白台一丁目9～18番先
4	視覚障害者誘導用施設設置工事(区道第892号)	西片一丁目15番～本郷六丁目26番先
5	コミュニティ道路整備工事(区道第869号)	向丘二丁目6番～千駄木一丁目12番先
6	電線共同溝整備工事(区道第889号)	音羽一丁目1番～水道二丁目13番先
7	電線共同溝設置工事(区道第870号)	向丘二丁目16番～根津一丁目27番先
8	駒塚橋補修工事	関口一丁目35番先
9	道路改修工事(区道第946号外)	大塚三丁目18～17番先外
10	道路改修工事(区道第213号)	小石川三丁目13～17番先
11	道路改修工事(区道第37号)	音羽一丁目23番先
12	道路改修工事(区道第156号)	小日向四丁目3番～小日向一丁目27番先
13	道路改修工事(区道第830号)	本郷二丁目30～35番先
14	道路改修工事(特別区道第239号)	白山二丁目15～9番先
15	公共下水道枝線整備工事	弥生二丁目付近
16	下水道施設整備工事	西片二丁目付近
