


## 主要公園工事等の進捗状況について

令和6年10月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規模	工期及び進捗率
1	公園等維持修繕工事（その1） 文京区立白山一丁目児童遊園外1園	維持修繕工事 1.0式 遊器具等取替及び補修工事 1.0式	令和6年7月30日 令和7年2月12日 (20%)
2	公園等維持修繕工事（その3） 文京区立新大塚公園外3園	維持修繕工事 1.0式 遊器具等取替及び補修工事 1.0式	発注準備中
3	公園再整備工事（文京区立窪町東公園） 文京区大塚三丁目31・32番	再整備工 1.0式	令和6年2月7日 令和6年9月20日 (100%)
4	公園再整備工事（文京区立切通公園） 文京区湯島四丁目6番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	令和6年10月1日 令和7年10月24日 (10%)
5	公園再整備工事（文京区立関口三丁目公園） 文京区関口三丁目2番	再整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	発注準備中
6	文京区立元町公園整備工事（第1期） 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 1.0式 擁壁補修工 1.0式	令和5年3月2日 令和6年10月17日 (100%)
7	文京区立元町公園整備工事（第2期） 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 1.0式 園内整備工 1.0式 トイレ整備工 1.0式	令和5年9月28日 令和7年11月25日 (50%)
8	文京区立元町公園下段補修工事 文京区本郷一丁目1番	施設補修工 1.0式	発注準備中
9	埋蔵文化財本調査委託（文京区立元町公園） 文京区本郷一丁目1番	埋蔵文化財本調査 1.0式	令和5年4月1日 令和8年3月31日 (60%)
10	公園再整備事業設計等委託（文京区立神明公園外1園） 文京区本駒込四丁目13番（神明公園） 文京区小石川三丁目30番（八千代町児童遊園）	基本設計 1.0式 実施設計 1.0式	令和6年4月1日 令和7年3月31日 (40%)
11	公園再整備事業設計等委託（文京区立大塚仲町公園外1園） 文京区大塚三丁目12番（大塚仲町公園） 文京区本郷五丁目22番（本郷五丁目児童遊園）	基本設計 1.0式 実施設計 1.0式	令和6年4月1日 令和7年3月31日 (40%)
12	文京区立西原町児童遊園拡張整備事業設計等委託 文京区千石四丁目34番	基本設計 1.0式 実施設計 1.0式	令和6年4月1日 令和7年3月31日 (40%)

# 令和6年度 文京区主要公園工事等の箇所図

<凡例>

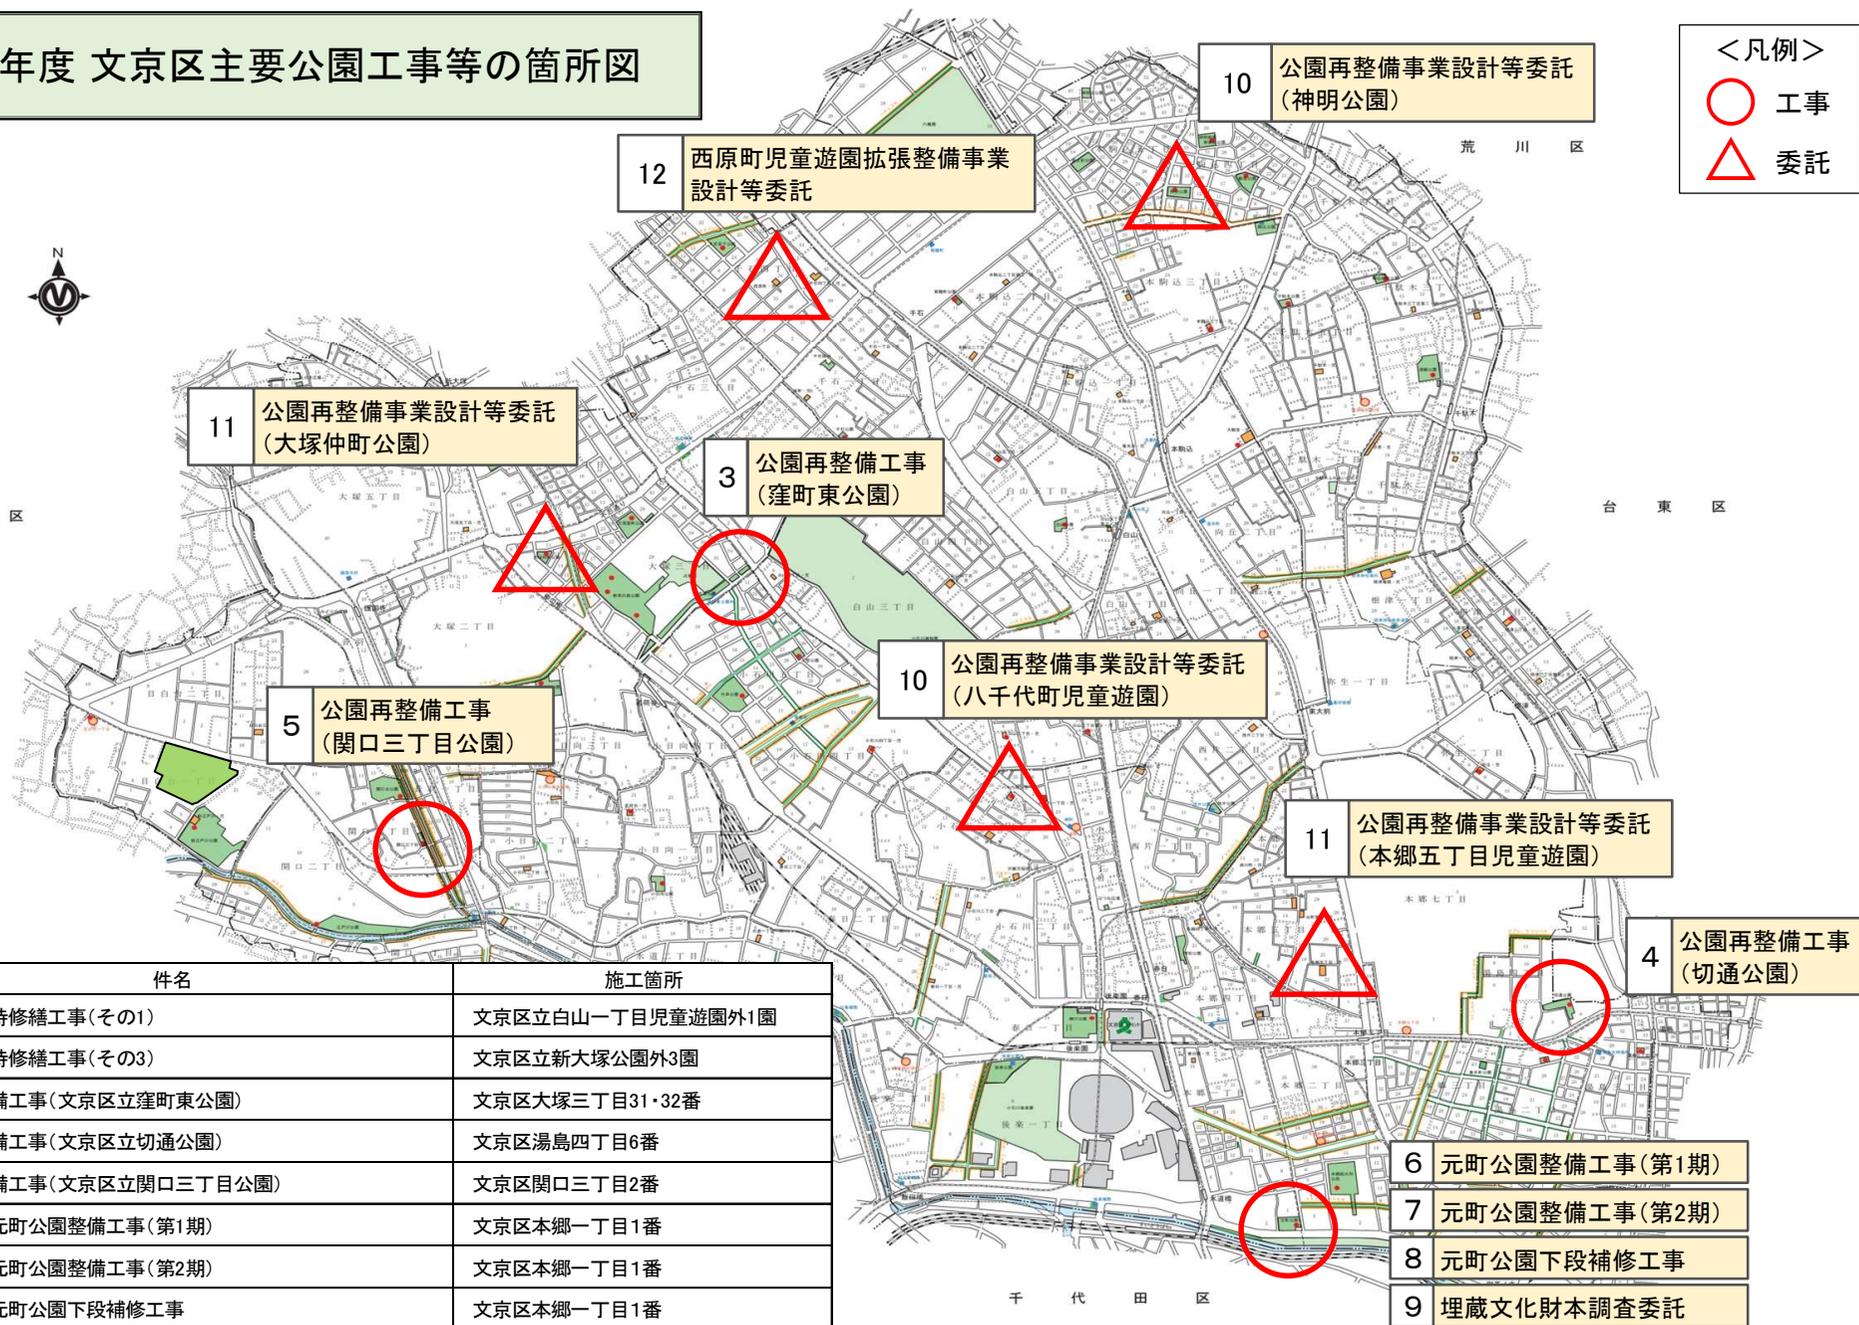

番号	件名	施工箇所
1	公園等維持修繕工事(その1)	文京区立白山一丁目児童遊園外1園
2	公園等維持修繕工事(その3)	文京区立新大塚公園外3園
3	公園再整備工事(文京区立窪町東公園)	文京区大塚三丁目31・32番
4	公園再整備工事(文京区立切通公園)	文京区湯島四丁目6番
5	公園再整備工事(文京区立関口三丁目公園)	文京区関口三丁目2番
6	文京区立元町公園整備工事(第1期)	文京区本郷一丁目1番
7	文京区立元町公園整備工事(第2期)	文京区本郷一丁目1番
8	文京区立元町公園下段補修工事	文京区本郷一丁目1番
9	埋蔵文化財本調査委託(文京区立元町公園)	文京区本郷一丁目1番
10	公園再整備事業設計等委託(文京区立神明公園外1園)	文京区本駒込四丁目13番外1箇所
11	公園再整備事業設計等委託(文京区立大塚仲町公園外1園)	文京区大塚三丁目12番外1箇所
12	文京区立西原町児童遊園拡張整備事業設計等委託	文京区千石四丁目34番

※1、2番については、複数箇所あるため図示なし
