


1 經過


都営地下鉄との設計協議において工事内容の精査や工程見直し、調査設計計画費や補償費の精査・変更等が生じたことから、事業期間及び資金計画が変更となった。

[都営地下鉄大江戸線春日駅]

東京メトロ
南北線改札
・地上階へ

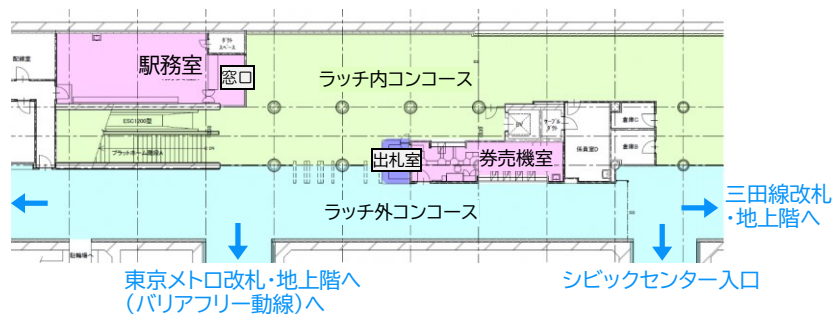

再開発事業の建物(地下広場)へ

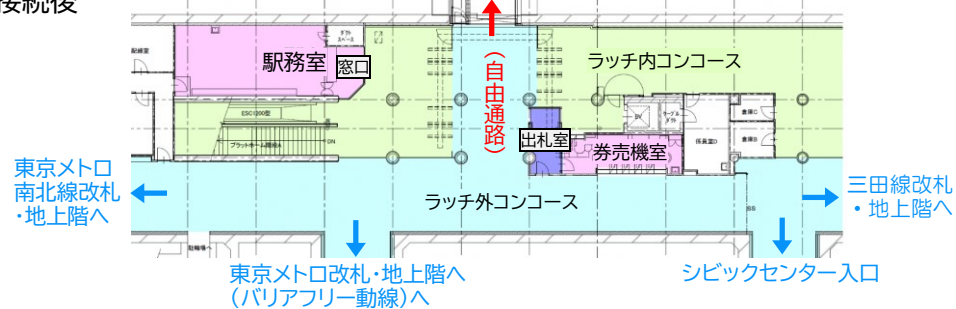

春日通り

地上 (千川通り)へ

地上 (春日通り)へ

地上 (イトーヨーロウ)へ

北街区通称ブリッジへ

南北線後楽園駅へ

南北線後楽園駅

地下広場

公共駐輪場

コンコース

(自由通路)

ホーム

EV

ESC

EV

ESC

シビックセンター

大江戸線春日駅

再開発ビル (南街区)

2 事業計画の変更について

- | | | | |
|---------|----------------------|--------|-----------------|
| ・従前事業計画 | ・事業期間等 | 建築工事完了 | 令和 5 年 12 月(予定) |
| | | 組合解散 | 令和 6 年 12 月(予定) |
| | ・総事業費 約 1,300 億円(予定) | | |
| ・変更事業計画 | ・事業期間等 | 建築工事完了 | 令和 5 年 11 月 |
| | | 組合解散 | 令和 7 年 12 月(予定) |
| | ・総事業費 約 1,360 億円(予定) | | |

3 今後の予定

7 年 2 月	大江戸線春日駅接続工事完了	供用開始
5 月	同駅施設改修工事完了	
12 月	組合解散	
