

文京区立柳町小学校の教室対策について

1 概要

Ⅱ期工事（新校舎北棟建設工事）エリアについては、埋蔵文化財試掘調査の結果、江戸時代の遺物等が発掘され、現在、令和6年5月までの予定で埋蔵文化財本調査を行っている。このことによる改築工事の工期変更と、学区域内の児童数の増加及び令和3年4月1日施行の義務教育標準法の改正への対応から、令和7年4月には改築工事開始時の予測を上回る教室数が必要となったため、新たな仮設校舎を建設し、Ⅱ期工事完了までの普通教室等の不足に対応する。

<仮設校舎概要>

鉄骨造地上2階 約950㎡（予定）

普通教室8室、多目的室2室、廊下、トイレ（バリアフリースイール含む。）等

2 スケジュール（予定）

実 施 設 計 令和6年1月～令和6年9月

建 設 工 事 令和6年10月～令和7年3月

供 用 開 始 令和7年4月

3 現況図及び第二仮設校舎平面図（案）


別紙1・2のとおり

4 その他

埋蔵文化財本調査に約7か月を要し、その後に地盤改良工事等が必要となることから、令和7年7月予定だったⅡ期工事（新校舎北棟建設工事）の完了は令和8年7月に、令和8年11月予定だった完全しゅん工は令和9年11月に予定を変更する。


文京区立柳町小学校 現況図

【別紙1】

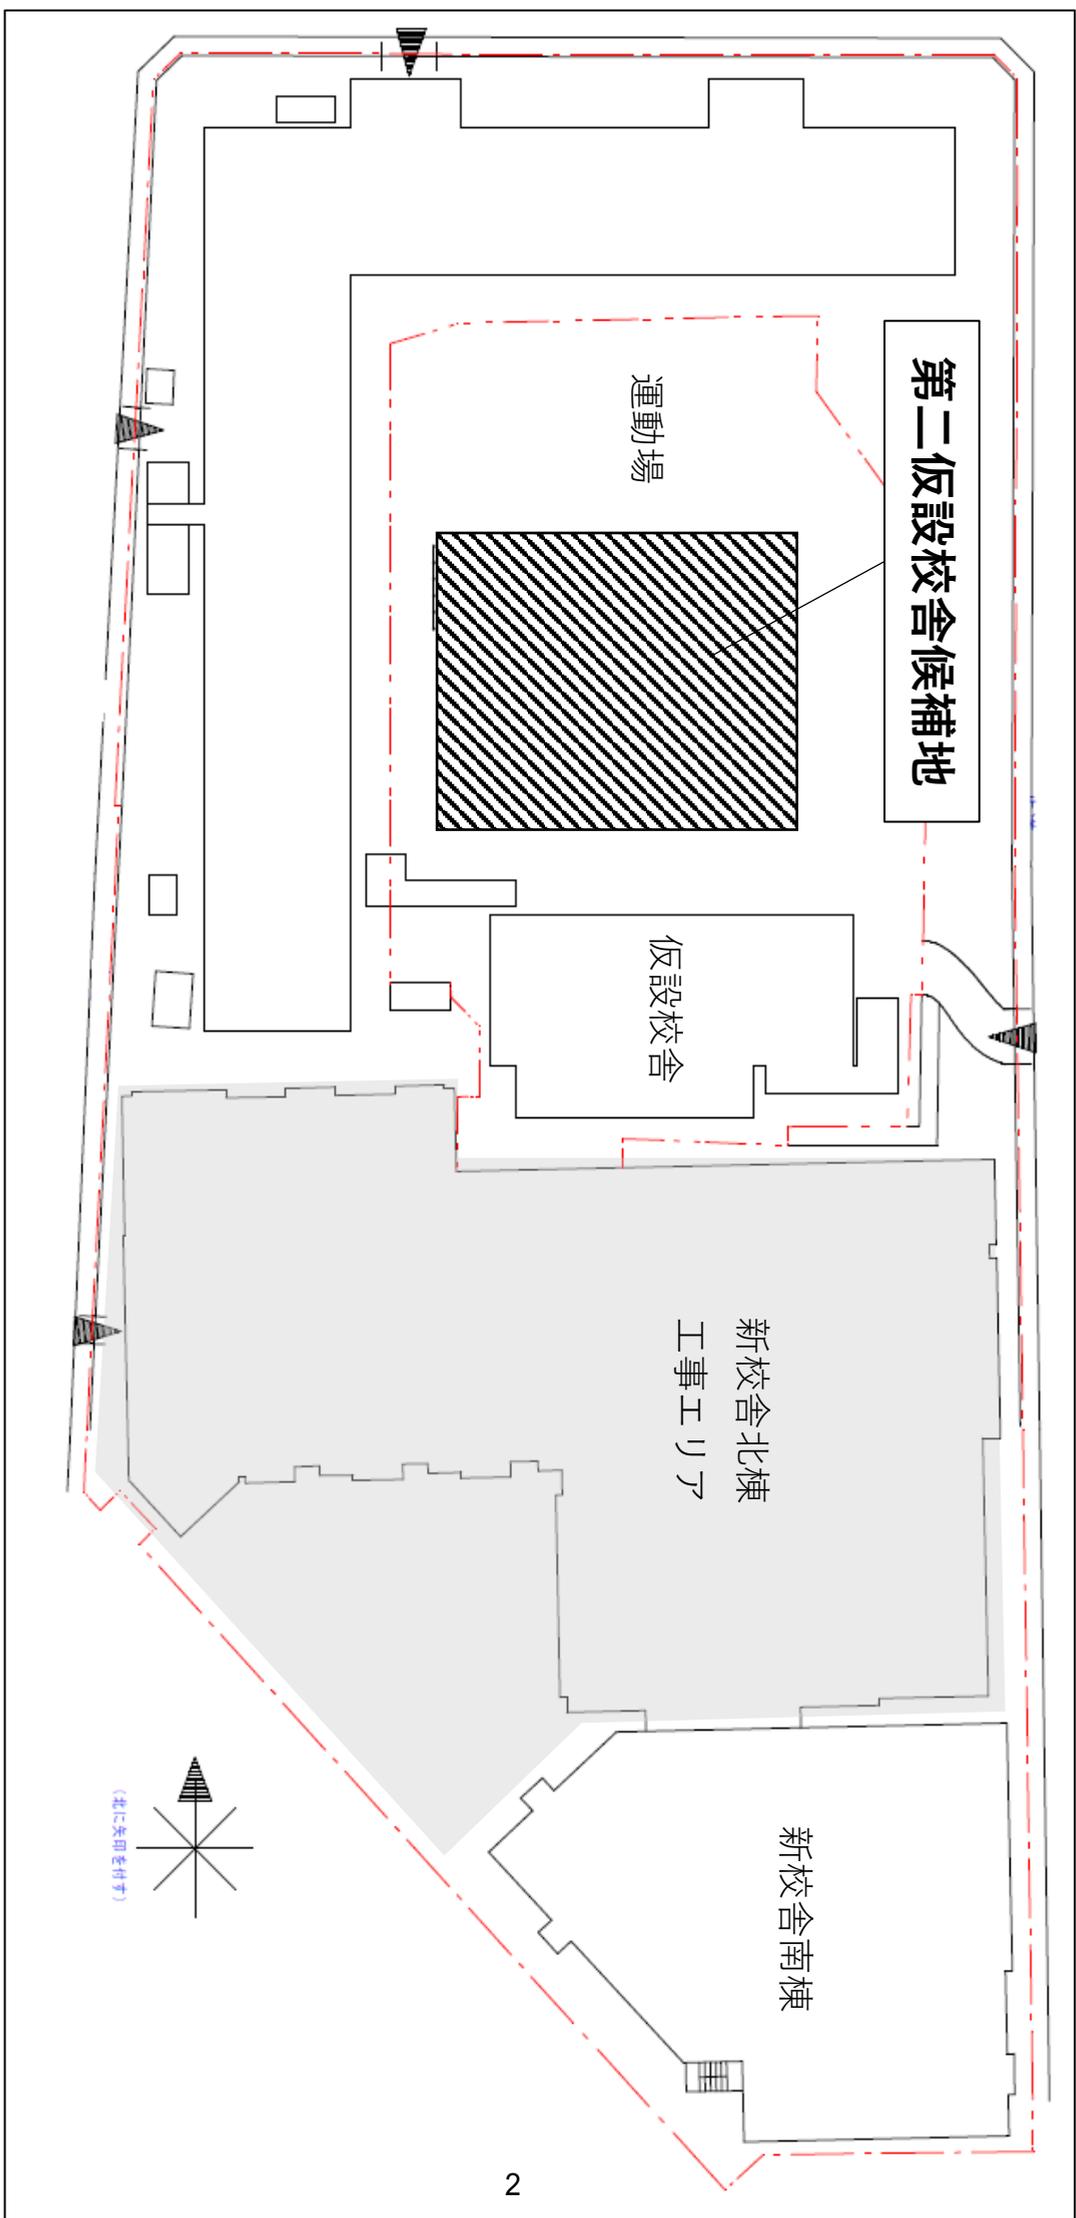

第二仮設校舎平面図 (案)

【別紙 2】

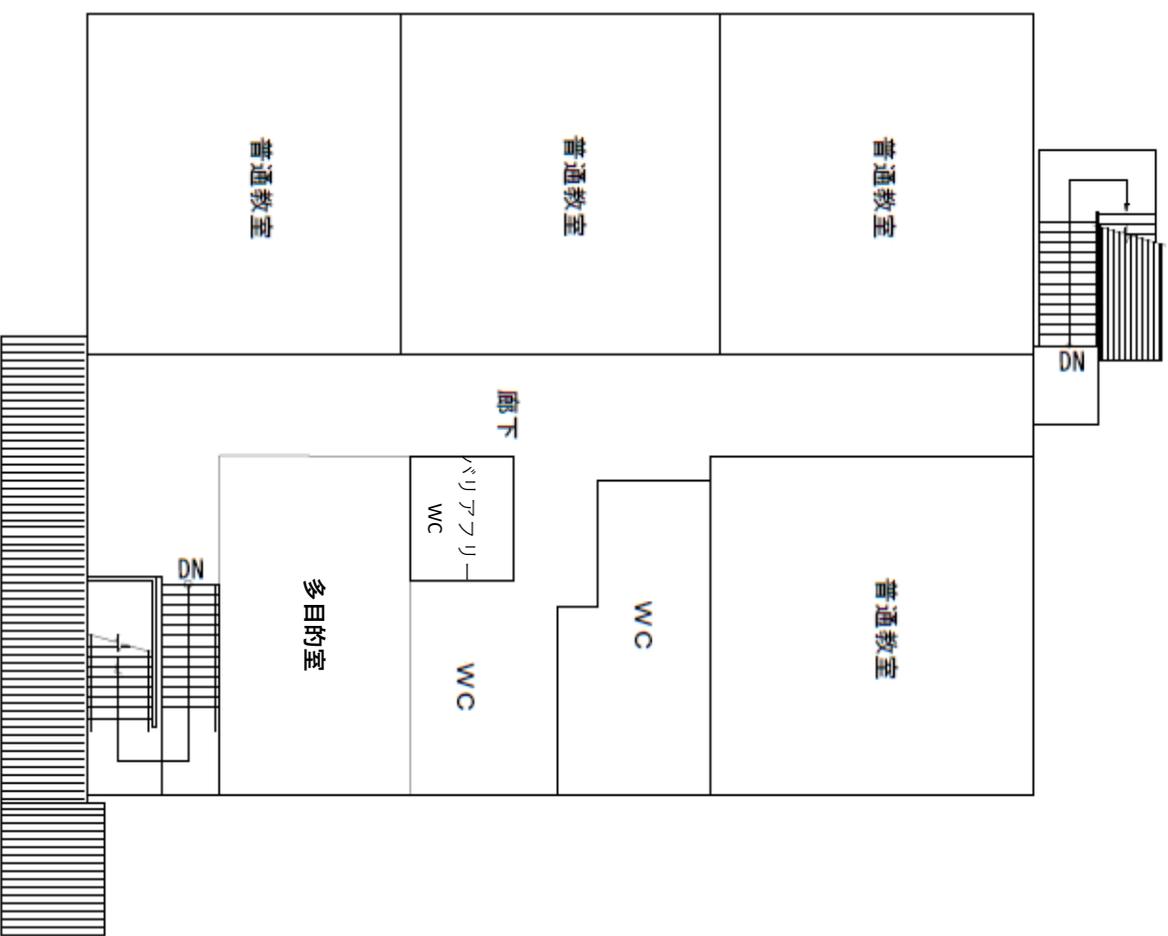

(参考) 児童数及び学級数の推計

	令和5年度推計							令和5年度推計						
	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合計
令和5年度	⁹ 105	⁵ 75	¹¹ 93	⁵ 74	² 68	³ 74	³⁵ 489	3	3	3	2	2	2	⁵ 15
令和6年度	90	107	76	94	75	69	511	3	4	3	3	3	2	18
令和7年度	94	90	107	76	94	75	536	3	3	4	3	3	3	19
令和8年度	115	104	100	117	86	104	626	4	3	3	4	3	3	20
令和9年度	110	115	104	100	117	86	632	4	4	3	3	4	3	21
令和10年度	103	110	115	104	100	117	649	3	4	4	3	3	4	21

※令和5年度は令和5年9月1日時点の人数及び学級数

(上段斜字体は特別支援学級の人数及び学級数(外数))

※令和6年度以降は推計の人数及び学級数

(特別支援学級は学区がないため令和5年度実績値を元に検討)
