

令和5年度進行管理 戦略点検シート

◎基本政策 5 環境の保全と快適で安全なまちづくり

主要課題	No. 41	誰もが暮らしやすいまちのバリアフリー化の推進
-------------	--------	------------------------

● 4年後の目指す姿・計画期間の方向性 ● 主要課題の戦略シートで設定している「4年後の目指す姿」と「計画期間の方向性」を転記しています。

4年後の目指す姿	多様な区民が利用する生活関連施設と、生活関連経路の一体的なバリアフリーが実現している。
計画期間の方向性	○バリアフリー基本構想の推進 バリアフリー基本構想の目標年次である令和7年度に向け、中間評価の結果等も踏まえ、地区別計画に基づく特定事業の進捗管理を行うとともに、道路や施設等のバリアフリー化を一体的に推進します。

0 昨年度の施策の方向性（昨年度の点検における「4 今後どのように進めていくか」）

令和4年度のバリアフリー基本構想の中間評価による特定事業の整理を踏まえ、完了事業の確認や、新たな特定事業の位置付けなどを実施し、更なるバリアフリー化の推進に取り組みます。
また、区道のバリアフリー化については、生活関連経路の一次経路と歩道のある二次経路に対し、年間350mを目標として、バリアフリー基本構想の観点から踏まえた整備を引き続き進めていきます。
さらに、公園のバリアフリー化については、公園再整備の中で地域住民等の意見も踏まえながら、計画的に進めていきます。

事業費（令和4年度） 上段：実績 下段：当初予算

1 どのような事業で・何をしたか（実績）

戦略シートの課題の解決手段として紐づけた計画事業について、「何をしたか」「何がどうなったか」を記しています。

事業番号	事業名称	所管課	事業の持つ役割	事業費(千円)
140	バリアフリー基本構想推進事業	都市計画課	重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する。	6,417千円 (9,274千円)
	主な取組実績			単位
	① 特定事業の進捗確認	着手事業数 完了事業数	件 件	H30(2018) 450 R1(2019) 457 R2(2020) 485 R3(2021) 500 R4(2022) 213 R5(2023)
	※修正…①のR2の実績			
	R1(2019)	バリアフリー基本構想に位置付けた特定事業の進捗状況について、各事業者へ合計675件の照会を行い、着手事業数は増加しています。		
R2(2020)	バリアフリー基本構想に位置付けた特定事業の進捗状況について、各事業者へ合計679件の照会を行い、着手事業数は増加しています。			
R3(2021)	バリアフリー基本構想に位置付けた特定事業の進捗状況について、各事業者へ合計683件の照会を行い、着手事業数は増加しています。			
141	バリアフリーの道づくり	道路課	すべての人が円滑に移動できる道路環境を整備する。	117,117千円 (123,859千円)
	主な取組実績			単位
	① 生活関連経路に指定された区道（一次経路及び歩道のある二次経路）のバリアフリー整備率	%	H30(2018) 5.5 R1(2019) 8.3 R2(2020) 10.1 R3(2021) 13.0 R4(2022) 15.0 R5(2023)	
142	無電柱化の推進	道路課	高齢者や障害者、ベビーカー利用者などが移動しやすい歩行空間を確保する。	262,706千円 (451,949千円)
	主な取組実績			単位
	① 日医大つつじ通りの無電柱化事業進捗率	%	H30(2018) 18.2 R1(2019) 27.3 R2(2020) 36.4 R3(2021) 44.3 R4(2022) 52.3 R5(2023)	
	② 巻石通り（第一期）の無電柱化事業進捗率	%	H30(2018) 20.0 R1(2019) 30.0 R2(2020) 40.0 R3(2021) 48.5 R4(2022) 57.1 R5(2023)	
R3(2021)	無電柱化の整備については、埋蔵文化財調査等により、一部遅れが生じています。			
143	公園再整備事業	みどり公園課	高齢者・障害者・子育てをしている人などにとっても、利用しやすい公園を整備する。	652,866千円 (720,330千円)
	主な取組実績			単位
	① 公園再整備意見交換会	回	H30(2018) 1 R1(2019) 6 R2(2020) 8 R3(2021) 4 R4(2022) 5 R5(2023)	
	② 公園再整備工事	園	H30(2018) 7 R1(2019) 2 R2(2020) 4 R3(2021) 6 R4(2022) 4 R5(2023)	
R3(2021)	公園再整備意見交換会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部をオンラインや書面等により開催しました。			

201	元町公園整備事業（旧元町小学校との一体的整備）	みどり公園課	高齢者・障害者・子育てをしている人などにとっても、利用しやすい公園を整備する。	200,562千円 (156,933千円)			
	主な取組実績						
	R3(2021)	令和3年10月、「旧元町小学校と元町公園との一体的活用事業」に関する区民説明会を実施しました。また、文京区立元町公園整備事業設計等委託による基本設計、実施設計を進めています。					
R4(2022)	令和4年7月に実施設計が完了し、5年3月に「元町公園整備計画」に関する区民説明会を実施しました。また、5年3月に工事議決し、着手しました。						
144	公衆・公園等トイレ維持事業	みどり公園課	高齢者・障害者・子育てをしている人などにとっても、利用しやすいトイレを整備する。	54,976千円 (51,503千円)			
	主な取組実績						
	① 公衆・公園トイレ整備工事	単位 箇所	H30(2018) 5	R1(2019) 2	R2(2020) 3	R3(2021) 2	R4(2022) 4
●特記事項（実績の補足）							
令和5年3月にバリアフリー基本構想の中間評価をとりまとめました。							

2 現総合戦略において、社会ではどのような動きがあったか（社会環境等の変化）	人口の増減や、国や都の動きなど、主要課題の背景に関して、令和2年度から5年度までの現総合戦略の計画期間において、「何が良かったか」「今後予想される」等の社会の変化を捉えています。
チェック	チェック項目
無	主要課題に関連する法改正があった（今後、法改正がある）
無	主要課題に影響を及ぼす変化等があった（今後、変化等の可能性がある）



3 現総合戦略における成果や課題は何か（点検・分析）	1と2に基づき、計画期間の方向性ごとに、令和2年度から5年度までの現総合戦略の計画期間において、「課題解決にどのような成果があったか」「成果が出ない要因は何か」「新たな課題が生じていないか」などを点検・分析します。
----------------------------	---

○バリアフリー基本構想の推進

令和2年度から4年度にかけて、特定事業の進捗状況の確認、完了した主な特定事業の現地確認、推進協議会での意見交換及び心のバリアフリーワークショップを開催し、5年3月に中間評価をとりまとめました。また、地区別計画に位置付けられた特定事業の内容や時期の見直しが課題となっていました。各事業者と調整の上、一部、特定事業の内容等の変更を行いました。特定事業の着手・完了事業数は年々増加傾向にあることから、引き続き、更なる事業推進を働きかけていきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、区道のバリアフリー化に遅れが生じていましたが、発注計画の工夫により、工期短縮に努め、計画通りの進捗率を確保しました。しかしながら、現在の進捗率では対象路線の整備完了までに相当の期間を要することが課題となっています。

公園については、公園再整備にあわせて、園路等のバリアフリー化やバリアフリースイートの設置を行い、バリアフリー化の更なる推進を図りました。

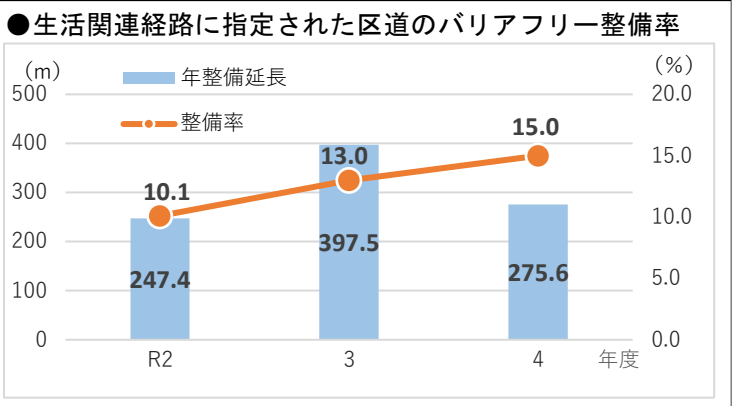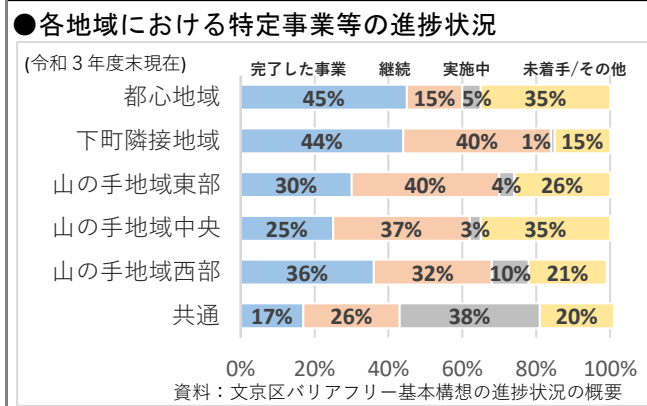

4 次期総合計画において、どのように進めていくか（展開）

3を踏まえ、「何の対応が必要か」「何をどのようにしていくか」など、令和6年度から9年度までの次期総合計画の計画期間における戦略としての進め方を記しています。

バリアフリー基本構想の目標年次である令和7年度に向け、中間評価の結果も踏まえ、地区別計画に基づく特定事業の進捗管理を行うとともに、道路や施設等のバリアフリー化を一体的に推進します。

区道のバリアフリー化については、生活関連経路の一次経路と歩道のある二次経路に対し、年間350mを目標として、バリアフリー基本構想の観点から踏まえた整備を引き続き進めていきます。また、更なる整備の促進のため、整備手法などの見直しを検討していきます。

さらに、公園再整備事業や元町公園整備事業において、園路等施設のバリアフリー化を図ります。

5 6年度、事業をどうするか（事業の見直し）

主要課題に紐づけられている個々の計画事業の6年度の検討の方向性を「継続」「レベルアップ」「見直し・縮小」「事業終了」「計画変更」で記します。

事業番号	計画事業名	所管課	次年度の方向性
140	バリアフリー基本構想推進事業	都市計画課	継続
141	バリアフリーの道づくり	道路課	継続
142	無電柱化の推進	道路課	継続
143	公園再整備事業	みどり公園課	継続
201	元町公園整備事業（旧元町小学校との一体的整備）	みどり公園課	継続
144	公衆・公園等トイレ維持事業	みどり公園課	事業終了（R5年度）
